Jadwal Pelaksanaan
Pekerjaan Perbaikan Chiller Sistem - 1

RTBMN - Biro Umum BAPETEN
TAHUN 2024

Tanggal Mulai	Jum, 26/4/2024	
Tanggal Selesai	Sel, 7/5/2024	
Display Week:	1	
Jumlah Hari	12	hari
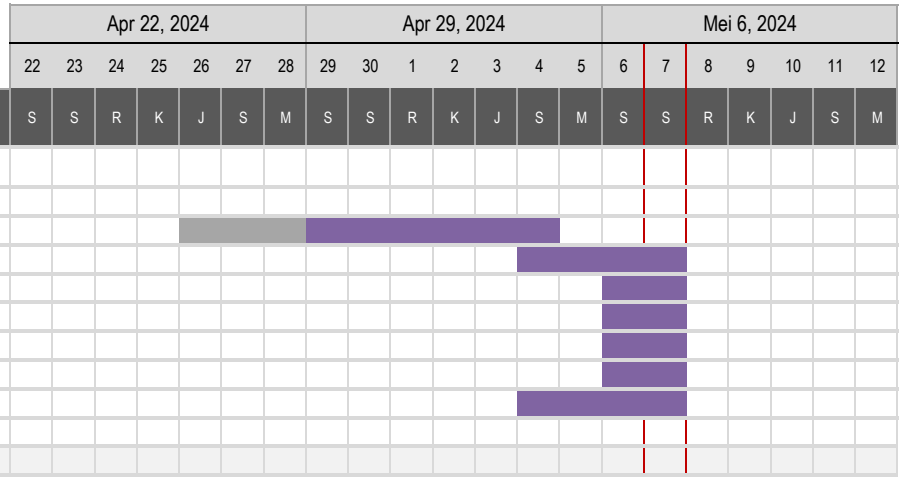
No	TASK	QUANTITY		PROGRESS	START	END	DAYS
1	**Pekerjaan Blok Kondenser**						
	- Pabrikasi Unit Coil	1	unit	40%	Jum, 26/4/2024	Sab, 4/5/2024	9
	- Pemasangan unit	1	unit	20%	Sab, 4/5/2024	Sel, 7/5/2024	4
2	**penggantian Freon 134a**	1	lot	5%	Sen, 6/5/2024	Sel, 7/5/2024	2
3	**penggantian Core Dryer**	6	unit	5%	Sen, 6/5/2024	Sel, 7/5/2024	2
4	**Pekerjaan Flushing**	1	lot	5%	Sen, 6/5/2024	Sel, 7/5/2024	2
5	**Penggantian Oli York**	20	liter	5%	Sen, 6/5/2024	Sel, 7/5/2024	2
6	**Install dan Testing**	1	lot	20%	Sab, 4/5/2024	Sel, 7/5/2024	4
				100%
